



# DP2D/LREP Projet DEM Fessenheim

CLIS Fessenheim  
Mise à jour du plan de démantèlement


30 mars 2021

Audio



# MISE À JOUR DU PLAN DE DÉMANTÈLEMENT

## Rappel du contexte de la mise à jour

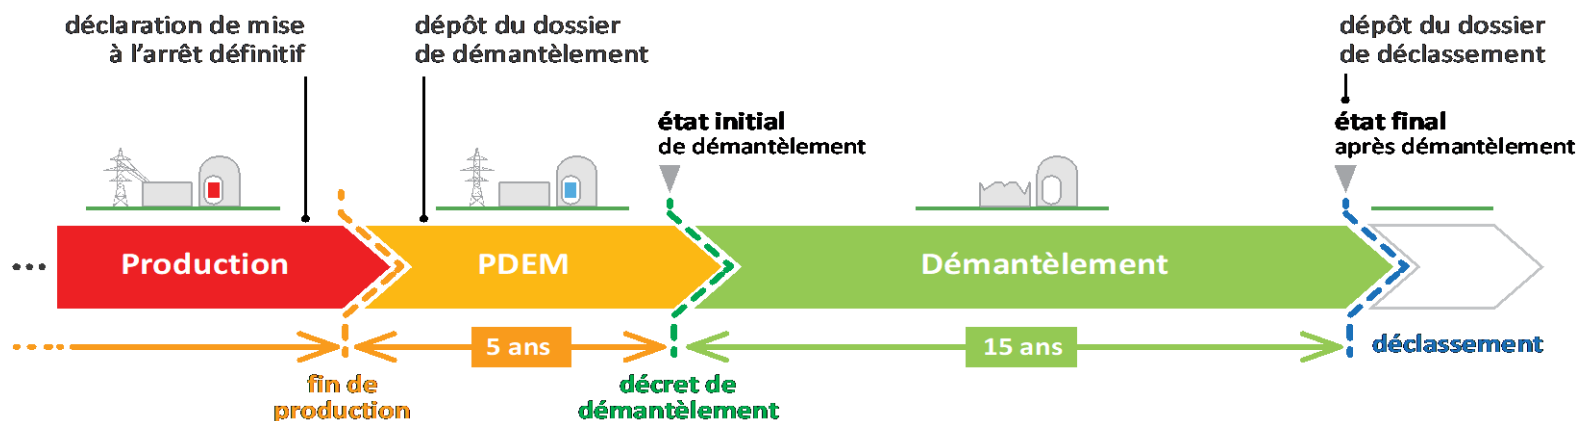

### Dépôt du Dossier de Démantèlement fin 2020

- Pièce 1 : Raison sociale de l'exploitant
- Pièce 2 : Description de l'installation avant démantèlement complet
- Pièce 3 : Plan de démantèlement
- Pièce 4 : Plan 1/25 000
- Pièce 5 : Plan 1/10 000
- Pièce 6 : Périmètre de l'installation (SO)
- Pièce 7 : Etude d'impact avec résumé non technique
- Pièce 8 : Rapport de sûreté
- Pièce 9 : Etude de maîtrise des risques avec résumé non technique
- Pièce 10 : Capacités techniques de l'exploitant
- Pièce 11 : Capacités financières de l'exploitant
- Pièce 12 : Information propriétaire
- Pièce 13 : Servitude d'utilité publique

Le plan de démantèlement est mis à jour au moment du dépôt du Dossier de Démantèlement

# MISE À JOUR DU PLAN DE DÉMANTÈLEMENT

## Principales évolutions 1/2

Lors de cette mise à jour plusieurs corrections de forme (syntaxe, reformulations,...) ont été apportées ainsi que quelques ajustements de contenu :

- **Synthèse §déchets** : mise à jour de la quantité totale de déchets en cohérence avec l'étude d'impact (405 000 tonnes dont 95% conventionnels contre 380 000 tonnes évoquées auparavant)
- **§3.5.4** : ajout d'éléments de planning sur la solution de repli de construction de nouveaux bâtiments d'Entreposage de Générateurs de Vapeur (GV) qui serait activée en cas de retard d'évacuation des GV usés – réponse à une demande ASN
- **§4.1.2** : correction des périmètres respectifs de deux affaires : PDFS0017 (remplacement du tampon matériel du bâtiment réacteur) et PDFS0006 (matériels démontés dans le bâtiment réacteur)
- **§4.1.2** : création de deux nouvelles affaires d'adaptation des fonctions support aux besoins du démantèlement (PDFS0026) et de raccordement des systèmes support non modifiés à la nouvelle distribution électrique (PDFS0027), qui viennent compléter la PDFS0003 (simplification de la distribution électrique.)

# MISE À JOUR DU PLAN DE DÉMANTÈLEMENT

## Principales évolutions 2/2

- **§4.1.2** : modification de la catégorie des affaires liées aux retraits des GV (PDFS00017, 18 et 19) : passée de A2 (important pour le respect du planning de démantèlement) à C (opportunité)
- **§4.3** : Ajout d'une marge de cinq ans entre la durée cible de la phase de démantèlement (15 ans + 1 an de déclassement administratif) et la durée de validité demandée pour le décret de démantèlement-réponse à une demande ASN
- **Annexe 5** : Mise à jour des objectifs prévisionnels d'évacuations du combustible utilisé pour tenir compte de l'avancement et mettre en cohérence les données avec le courrier envoyé par EDF/DCN à l'ASN fin aout 2020. Les demandes de réceptions/entreposages faites par ORANO à l'ASN pour des assemblages présentant des particularités ainsi que le planning prévisionnel sont notamment cités.
